TOTO

施工説明書

2009.2版

ハーフバスルーム

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
取付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

■ このたびはTOTOハーフバスルームをご採用いただきましてありがとうございました。
■ 製品の機能が十分発揮されるように、この「施工説明書」の内容にそって正しく施工してください。
■ 浴槽据付・各種施工と電気・水道工事は工程を十分に打合わせのうえ行ってください。
■ 工事完了後は、お客様に操作説明を行い、この施工説明書と同封の「取扱説明書（保証書付）」をお渡しください。
なお、「保証書」には必要事項を必ず記入してください。
■ 施工説明書に記載の品番は、改訂する場合がありますので、ご了承ください。

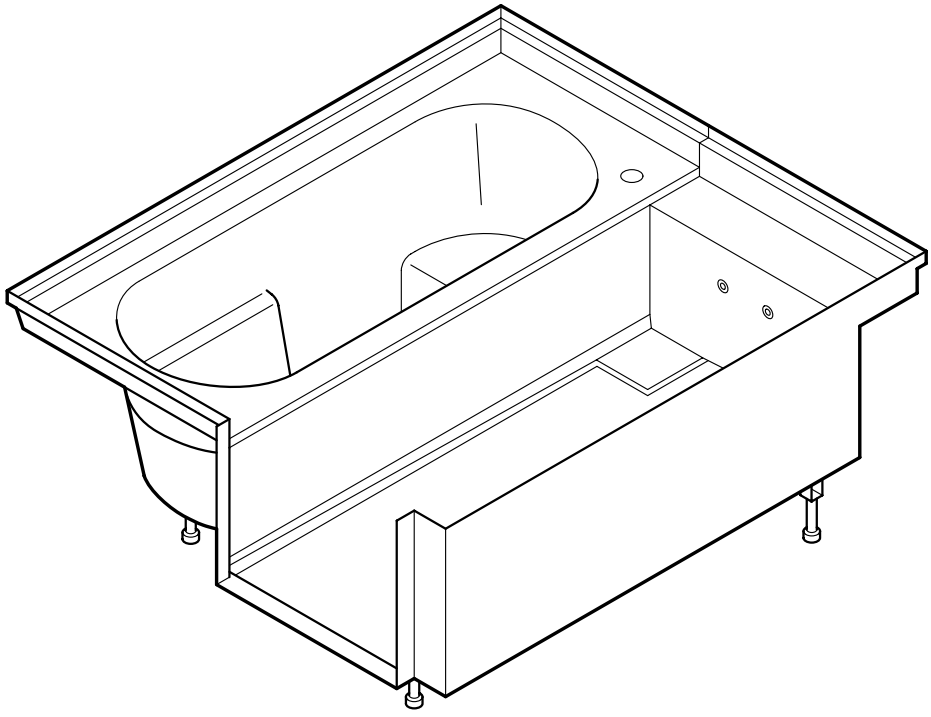

●施工者の皆様へ

施工説明書の内容改訂を実施しました。
変更内容を下記しますのでよろしくお願いいたします。

改訂年月 ： 2009年2月

No.	内容.
1	P14　寸法図　追記修正
2	P11、P12　寸法図修正

もくじ

1. 安全上の注意 …… 3～7

2. セット内容 …… 8～10

3. 寸法図 …… 11～17

3-1 一般図（内寸：1600×1600サイズ） …… 11
3-2 一般図（内寸：1600×2050サイズ） …… 12
3-3 ドア廻り詳細図 …… 13
3-4 墨出し …… 15
3-5 給水・給湯配管立上げ …… 16
3-6 雑排水管接続位置 …… 17

4. 施工手順 …… 18～19

5. 工事区分 …… 20

6. 必要工具 …… 21

7. 施工要領 …… 22～40

7-1 床の設置 …… 22
（1）事前組立て …… 22
（2）脚固定金物取付け（別売品） …… 22
（3）床の設置 …… 23
（4）レベル調整 …… 23
（5）雑配水管取付け …… 24
（6）床固定 …… 24
7-2 シャワー水栓用給水・給湯管接続 …… 25
（1）点検口内ふた取り出し …… 25
（2）接続 …… 25
7-3 浴槽の設置 …… 26
（1）浴槽事前準備 …… 26
（2）床転倒防止治具取付け …… 28
（3）浴槽据付け …… 28
7-4 浴槽と床の接続 …… 30
（1）壁のせ部ねじ止め …… 30
（2）浴槽のレベル調整 …… 30
（3）アジャスター脚固定 …… 31
（4）浴槽・床接続アングル取付け …… 31
7-5 浴槽排水管の接続 …… 32
（1）浴槽排水管の接続 …… 32
（2）排水管の漏水確認 …… 32
7-6 浴槽脚固定 …… 33
7-7 設備配管接続 …… 33
（1）バス水栓用配管接続 …… 33
（2）追焚アダプタ用配管の接続 …… 34
（3）点検口内ふた取付け …… 34
7-8 その他部品取付け …… 35
（1）追焚トレー・ホース取付け …… 35
（2）エプロン取付け …… 36
（3）バス水栓のハンドル取付け …… 37
（4）トラップ排水ピース取付け …… 38
（5）トラップ排水フィルター・トラップカバー取付け …… 38
7-9 水密部仕上げ …… 39
【参考】その他現場工事 …… 40
● シャワー水栓取付け …… 40
● ドア取付け …… 40
● 壁・天井・その他器具の施工 …… 41
● ドア廻り・天井・壁などの水密部仕上げ …… 41

8. 清掃 ……42

9. 別売品 ……43
